


10月度進捗状況及び11月度工事予定表

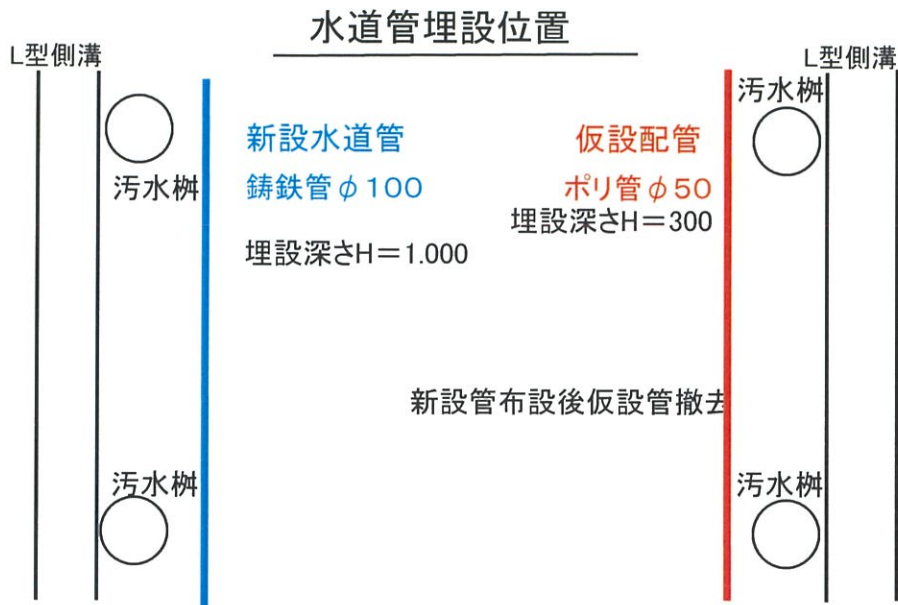

【 水道管布設工事 予定表 】		
7工区-1 (本町)		
①	新給水管布設・給水切替工	10月 13日～10月21日
②	仮設配管撤去工	10月 23日～10月24日
7工区-1 完了		
7工区-2		
①	仮設配管布設工	10月25日～10月26日
②	仮設配管給水切替工	10月27日～10月28日
①	本管布設布設工事	10月30日～11月 1日
②	新給水管布設・給水切替工	11月 2日～11月 4日
①	仮設配管撤去工	11月 6日～11月 7日
7工区-2 完了		
6工区 (北魚町)		
舗装切断工		
		11月11日
①	仮設配管布設工	11月 8日
②	仮設配管布設工	11月 9日
③	仮設配管布設工	11月13日
④	仮設配管布設工	11月14日
⑤	仮設配管給水切替工	11月15日～11月22日
①	本管布設工	11月23日
②	本管布設工	11月24日
③	本管布設工	11月25日
④	本管布設工	11月27日
⑤	本管布設工	11月28日
⑥	本管布設工	11月29日
⑦	本管布設工	11月30日
⑧	本管布設工	12月 1日
⑨	本管布設工	12月 2日
①	新給水管布設・給水切替工	12月 4日～12月11日
①	仮設配管撤去工	12月12日～12月14日

【お問合せ先】

株式会社 中村組 現場担当者 奥山 和俊 携帯電話 080-4575-2599

施工中は、車両通行止めになります。(歩行者は通行できます。)

車の移動をお願いする場合があります。

作業時間【8:45～16:45】雨天順延になります。

水道管布設工事のお知らせ・工事予定表 7工区-1、7工区-2(本町) 6工区(北魚町)

予定表は別紙

