


## 3月度進捗状況及び4月度・5月度工事予定表

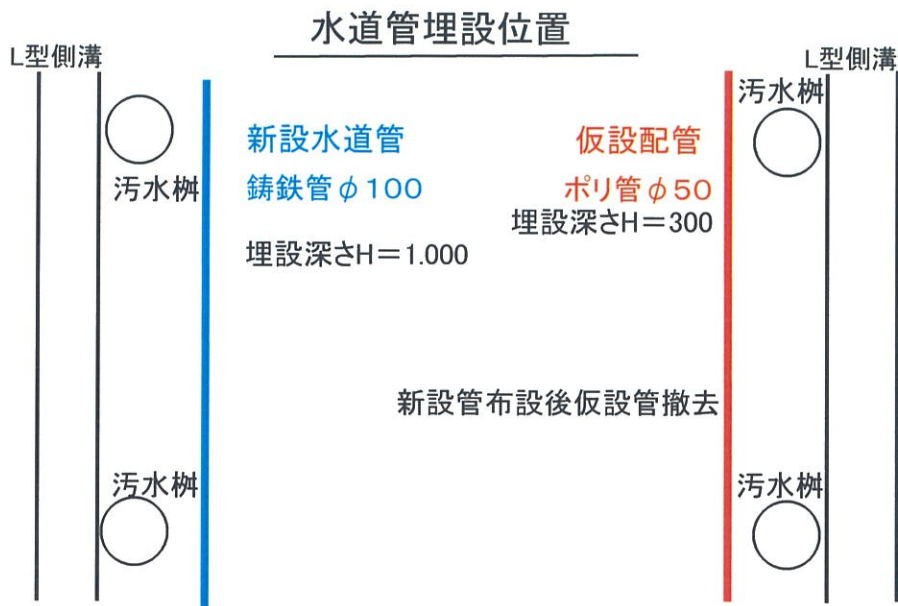

### 【 水道管布設工事 予定表 】

4工区 (天神町 ) 完了	3月19日
3工区 (蛭子町 )	
① 仮設配管布設工 (完了)	3月20日～3月25日
① 仮設配管給水切替工	3月26日～4月 3日
① 本管布設工	4月 4日
② 本管布設工	4月 5日
③ 本管布設工	4月 6日
④ 本管布設工	4月 8日
⑤ 本管布設工	4月 9日
⑥ 本管布設工	4月10日
⑦ 本管布設工	4月11日
⑧ 本管布設工	4月12日
⑨ 本管布設工	4月15日
⑩ 本管布設工	4月16日
⑪ 通水・洗管、水圧試験	4月17日
① 新給水管布設・給水切替工	4月17日～4月26日
① 仮設配管撤去工	4月26日～5月 2日
3工区 (蛭子町 ) 完了	
2工区 (新町一区 )	
舗装切断工	4月23日、4月24日
① 仮設配管布設工	5月 7日～5月13日
① 仮設配管給水切替工	5月14日～5月21日
① 本管布設工	5月22日～6月 1日
① 新給水管布設・給水切替工	6月 3日～6月13日
① 仮設配管撤去工	6月14日～6月19日
2工区 (新町一区 ) 完了	6月19日
1工区 (新町二区 )	6月20日から 工事着工予定
舗装切断工	6月 4日、6月 5日

#### 【お問合せ先】

株式会社 中村組 現場担当者 奥山 和俊 携帯電話 080-4575-2599

施工中は、車両通行止めになります。(歩行者は通行できます。)

車の移動をお願いする場合があります。

作業時間【8:45～16:45】 雨天順延になります。

水道管布設工事のお知らせ・工事予定表 3工区(蛭子町) 2工区(新町一区)

予定表は別紙

